



Vialmín EP
Trabajamos por la vialidad



**EMPRESA PUBLICA DE
MANTENIMIENTO,
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD, AMBIENTE
Y MINERÍA DE PAUTE
VIALMIN EP**

**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2020**

**PERIODO
2020**



RENDICION DE CUENTAS

PERIODO 2020

Contenido:

¿Quiénes Somos?.....	2
Misión.....	2
Visión	2
ORGANIGRAMA VIALMIN EP:	3
CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2020	3
FINANCIAMIENTO:	3
OBRAS REALIZADAS 2020	6



RENDICION DE CUENTAS

PERIODO 2020

EMPRESA PÚBLICA DE MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD, AMBIENTE Y MINERÍA DE PAUTE VIALMIN EP

¿Quiénes Somos?

La empresa VIALMIN EP fue creada mediante ordenanza municipal en el año 2013 con el nombre de MIVIA, en el año 2014 mediante reforma se cambia de nombre a VIALMIN EP. En el año 2017 comienza sus actividades productivas con 8 funcionarios 2 administrativos y 6 operativos. En el año 2020 la empresa trabaja con normalidad con todo el personal esto es con 5 administrativos y 6 operadores, compartiendo un mismo fin común, el cual, es el desarrollo y crecimiento de la empresa.

Misión


Establecer y ejecutar políticas para implementar un sistema integrado de regulación control y gestión del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, a través del uso de tecnología (sistema inteligente de manejo de tráfico), que permita la integración armoniosa de todos los entes demandantes de movilidad que redunde en mejorar la calidad de vida y la preservación del medio ambiente.

Visión

Satisfacer la demanda de los servicios de forma sostenible logrando ser una empresa de referencia a nivel local y nacional, en los trabajos de mantenimiento, infraestructura, vialidad, ambiente y minería, sustentado en una alta competitividad, mediante una imagen empresarial destacada, manteniendo un personal altamente calificado, motivado y comprometido en sus objetivos de trabajo.

ORGANIGRAMA VIALMIN EP:

El organigrama que se presenta a continuación fue aprobado por el Directorio de VIALMIN EP, con el objetivo de desarrollar de manera eficiente los procesos administrativos de la Institución, considerando que cada cargo debe cumplir funciones específicas detalladas en cada perfil.



CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2020

FINANCIAMIENTO:

1. Ingresos. –

Durante el año 2020, VIALMIN EP dispuso de los siguientes ingresos, para la ejecución de sus actividades y cumplimiento de objetivos propuestos a enero 2020.



RENDICION DE CUENTAS

PERIODO 2020

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO INGRESOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2020

Tabla 1 Ejecución presupuestaria ingresos

INGRESOS CORRIENTES		\$ 439,805.70
Venta de bienes y servicios	\$ 436,298.67	
Maquinaria y Equipo (Arrendamiento)	\$ 3,080.53	
Otros ingresos	\$ 426.50	
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		\$ 111,101.45
Fondos de Autogestión	\$ 16,448.69	
Cuentas pendientes por cobrar	\$ 59,010.39	
Anticipos por devengar	\$ 35,642.37	
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2020		\$ 550,907.15

2. Gastos e inversión. –

VIALMIN EP para dar cumplimiento a los diferentes contratos durante el año 2020, contrajo obligaciones con terceros por diferentes rubros, como se muestra en el siguiente resumen:

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2020

Tabla 2 Ejecución presupuestaria gastos

EGRESOS DE INVERSIÓN		\$ 533,243.90
Gastos de personal para inversión	\$ 139,495.79	
Bienes y servicios para inversión	\$ 54,744.65	
Obras Públicas	\$ 331,657.39	
Otros egresos de inversión	\$ 5,303.04	
Transferencia Inversión	\$ 2,043.03	
BIENES DE LARGA DURACIÓN		\$ 718.75
Activos de Larga Duración	\$ 718.75	
PASIVO CIRCULANTE		\$ 29,023.93
Pasivo Circulante	\$ 29,023.93	
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2020		\$ 562,986.58

Observaciones: La tabla 1 y 2 muestran la ejecución presupuestaria del año fiscal 2020, en donde se obtiene como resultado final un déficit presupuestario de USD



RENDICION DE CUENTAS

PERIODO 2020

12.079,43 (DOCE MIL SETENTA Y NUEVE CON 43/100 DÓLARES AMERICANOS), debido a que existen proyectos que no han sido ejecutados y afectados presupuestariamente en su totalidad hasta el 31 de diciembre de 2020, mismos que forman parte del presupuesto del año 2021.

Nota: Datos tomados del Reporte de la Ejecución Presupuestaria generada por el Sistema Ofimático SIG-AME.

OBRAS REALIZADAS 2020

1. MANTENIMIENTO VIAL EN LA COMUNIDAD DE UZHUPUD, PARROQUIA CHICAN, CANTON PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY.

Firma del contrato: 27/12/2019

Fecha de inicio de trabajos: 27/19/2019

Plazo de ejecución: 30 días.

Fecha de terminación de la obra: 25/01/2020

Monto del contrato: 12.068,60

Monto ejecutado 12.068,04



2. MANTENIMIENTO VIAL DE VARIAS VIAS DE LA PARROQUIA EL CABO, CANTON PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY.

Firma del contrato: 26/12/2019

Fecha de inicio de trabajos: 07/01/2020

Plazo de ejecución: 45 días.

Fecha de terminación de la obra: 20/02/2020

Monto del contrato: 23.162,25

Monto ejecutado: 23.161,43



3. OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN EL CANTON PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY.

Firma del contrato: 13/01/2020

Fecha de inicio de trabajos: 13/01/2020

Plazo de ejecución: 60 días.

Fecha de terminación de la obra: 19/03/2020

Monto del contrato 77.080,32

Monto ejecutado 77.080,32



4. MANTENIMIENTO EN VIAS DE LASTRE DEL CANTON PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY.

Firma del contrato: 23/07/2020

Fecha de inicio de trabajos: 02/09/2020

Plazo de ejecución: 60 días.

Fecha de terminación de la obra: 12/10/2020

Monto del contrato 160.714,29

Monto ejecutado 160.714,26



5. CULMINACIÓN DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO ETAPA 7 DEL CANTÓN SANTA ISABEL.

Firma del contrato: 21/02/2020


Fecha de inicio de trabajos: 03/03/2020

Plazo de ejecución: 120 días.

Fecha de terminación de la obra: 22/09/2020

Monto del contrato: 280.705,84

Monto ejecutado: 286.248,74

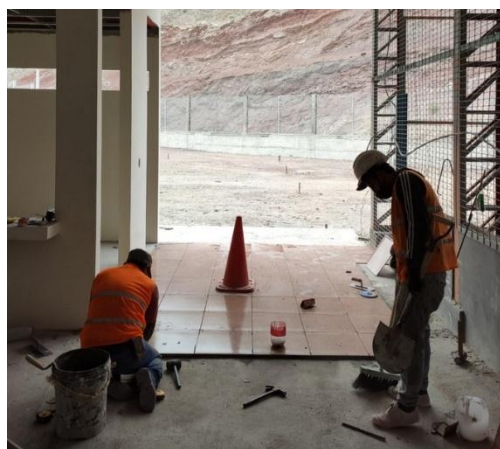

6. MANTENIMIENTO VIAL EN LA PARROQUIA DE GÜEL DEL CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY.

Firma del contrato: 20 / 10 / 2020

Fecha de inicio de trabajos: 19 / 10 / 2020

Plazo de ejecución: 45 días.

Fecha de terminación de la obra: 01 / 12 / 2020

Monto del contrato: 28.000,00

Monto ejecutado: 14.000,00

